



## Status nasjonale prosjekter

<b>Saksnummer</b>	21/2017
<b>Avsender</b>	Senterleder
<b>Møtedato</b>	15.06.2017

### Bakgrunn for saken

Senterets nasjonale prosjekter er de prosjektene som er igangsatt basert på strategisk vurdering av nasjonale kunnskapsbehov og med samarbeidspartnere i nasjonal forvaltning eller med et tydelig nasjonalt fokus. I hovedsak er disse samarbeidsprosjekter med Direktoratet for e-helse eller Helsedirektoratet.

Vedlagt er statusrapporter for disse prosjektene med tanke på økonomi og faglig framdrift.

### Forslag til vedtak

Styringsgruppen tar saken til orientering.

### Vedlegg

Statusrapport nasjonale prosjekter



Nasjonalt senter for  
e-helseforskning

# Prosjektrapportering

Nasjonalt senter for e-helseforskning

Rapportering på nasjonal oppdragsportefølje  
April 2017



# Oversikt pågående nasjonale prosjekter 2017 – side 1

Portefølje (porteføljestyre)	Nr. (prosjektnr)	Prosjekt (prosjektleder)	Samarbeidspartner	Kort beskrivelse av prosjektet
En journal (Rune Pedersen)	2017-1a (43 482)	Følgforskning for utprøving EIEJ ved Helseplattformen (Rune Pedersen)	Helseplattformen/ Direktoratet for e-helse	Prosjektet skal legge til rette for følge- implementeringsforskning og metodeevaluering nasjonalt, med fokus på Helseplattformen og EIEJ generelt.
	2017-1b (43 480)	Planlegge og gjennomføre nullpunktsanalyser EIEJ (Gunn Hilde Rotvoll)	Direktoratet for e-helse	Prosjektet skal planlegge og gjennomføre nullpunktsmåling på utvalgte effektområder for «En innbygger – én journal» i kommunal helse- og omsorgstjeneste.
	2017-1c (43 478)	Ontologibaserte terminologier (Kristian Nicolaisen)	Direktoratet for e-helse	Konsekvensutredning av overgangen til ontologibaserte terminologier. Fokus på tekniske forutsetninger, bruksområde, potensiale.
	2017-1d (43 479)	Utredning av arkitekturmessig praksis og mulighetsrom for klinisk beslutningsstøtte (Kristian Nicolaisen)	Direktoratet for e-helse	Utrede mulighetsrommet for klinisk beslutningsstøtte med fokus på standarder og utviklingsretning hos ledende leverandører.
Nasjonale ehelseløsninger (Monika Johansen)	2016-2b (43 449)	Kjernejournal (3B) (Kari Dyb)	Direktoratet for e-helse	1) artikkel om legers erfaringer med kjernejournal, 2) rapport om prosjektlederens erfaringer med å innføre kjernejournal i helseforetakene, 3) Litteraturstudie om helsepersonells bruk av e-helse.
	2017-2a (43 461)	Kjernejournal 2 - kritisk informasjon (Nils Kolstrup/Monika Johansen)	Direktoratet for e-helse	Vurdere registreringsgraden av kritisk informasjon i kjernejournal. Få et kunnskapsbasert estimat for prevalens av utvalgte diagnoser/tilstander av kritisk informasjon i kjernejournal.
	2017-2b (43 462)	Multidose 2 (Trine Bergmo)	Direktoratet for e-helse	Undersøke om overgang til elektronisk multidose bidrar til økt pasientsikkerhet og økt kvalitet i legemiddelbehandlingen. Dokumentere erfaringer og gi kunnskap om implementeringsprosessen.
	2017-2c (43 463)	Samhandlingsarena 2 (Gunn Hilde Rotvoll)	Direktoratet for e-helse	Prosjektet skal bidra med kunnskap og evaluering i utviklingen av et digitalt støttet person-sentrert, helhetlig og pro-aktivt pasientforløp.
	2017-2d (43 283)	m&eHealth (Gunn Hilde Rotvoll)	SINTEF	m&eHealth forener ledende norske forskningsmiljøer og bedrifter med internasjonale ambisjoner for å løse samfunnets behov for e-helseløsninger for personsentrerte, helhetlige og proaktive hjemmeoppfølgingstjenester for personer med kroniske sykdommer og langvarige behov
	2017-2e (43 464)	Nasjonale e-helseløsninger (Line L. Warth)	Strategisk prosjekt NSE	Produsere kunnskap om innføring og bruk av e-resept og kjernejournal, om hvordan de er innført i primær og spesialisthelsetjenesten, og om hvordan leger bruker løsningene i lokale praksiser.
	2017-2f (43 465)	Nytteeffektene av digitale helsetjenester (Paolo Zanaboni)	Direktoratet for e-helse / Universitetssykehuset i Nord Norge / Norges Arktiske universitet (UiT)	Måle nytteeffekter av digitale helsetjenester for innbyggere. Tjenestene som er inkludert i prosjektet er digital dialog med fastlege, digitalt innsyn i egen journal og mine behandlingsvalg.

# Oversikt pågående nasjonale prosjekter 2017 – side 2

Portefølje (porteføljestyre)	Nr. (prosjektnr)	Prosjekt (prosjektleder)	Samarbeids-partner	Kort beskrivelse av prosjektet
VFT, m-helse og egenmestring (Siri Bjørvig)	2016-3a (43 451)	Kunnskapsoppsummering velferdsteknologi (4a) (Undine Knarvik)	Helsedirektoratet	Gi oversikt over utprøvde velferdsteknologiske løsninger i Norge og effekten av disse, samt gi en oversikt over 5 lands tilnærming til VFT på styring-, organisatorisk- og arkitektonisk nivå.
	2016-3b (43 452)	Barn og unge (4B) (Marianne Trondsen)	Helsedirektoratet	Etablere kunnskap om hvordan velferdsteknologi kan bistå barn og unge med nedsatt funksjon og deres familier. Kunnskapsoppsummering og følgeforskning.
	2016-3c (43 453)	Sosial kontakt (4C) (Elin Johnsen)	Helsedirektoratet	Følgeforskning som skal etablere kunnskap om hvordan kursing i bruk av teknologi kan bidra til å vedlikeholde og styrke eldre sine muligheter til å opprettholde sitt sosiale nettverk.
	2017-3a (43 466)	Datautveksling - fra pasient til helsetjeneste (Eirik Årsand)	Direktoratet for e-helse	Skafe oversikt over muligheter, begrensninger og state-of-the-art for overføring av pasient-genererte data inn til helsevesenet, via Helsenorge.no.
	2017-3b (43 467)	Pasientfortellinger (Marianne Trondsen)	Idéutvikling NSE	Beskrive et konsept og forankre hvordan vi kan produsere forskningsbasert kunnskap om pasient-pårørendeerfaringer i Norge gjennom en digital formidlingskanal for slik kunnskap.
	2017-3c (43 483)	Barn og unge 2 (Marianne Trondsen)	Helsedirektoratet	Etablere kunnskap om hvordan velferdsteknologi kan bistå barn og unge med nedsatt funksjon og deres familier.
	2017-3d	Sosial kontakt 2 (Elin Johnsen/Siri Bjørvig)	Helsedirektoratet	Etablere kunnskap om hvordan kursing i bruk av teknologi (data/mobil/nettbrett) kan bidra til å vedlikeholde og styrke eldre sine muligheter til å opprettholde sitt sosiale nettverk.
Helse-dataanalyse (Anne Torill Nordsletta)	2016-4e (43 460)	My data 2016 (2E) (Per Atle Bakkevoll)	Direktoratet for e-helse	Utvikling av samarbeid og kompetanse innen Blockchain/Distributed Ledger Teknologi og helse. Samarbeid mellom Finland og Norge.
	2017-4a (43 470)	Helsesdata (Per Atle Bakkevoll)	Direktoratet for e-helse	Bidra til mer kunnskap om moderne teknologier innenfor dataanalyse som anvendes i helsesektoren og forskningssektoren internasjonalt.
	2017-4b (43 472)	E-helse monitor 2017 (Gunn Hilde Rotvoll)	Direktoratet for e-helse	Bistand til Direktoratet med å utvikle og etablere en enkel, fungerende e-helsemonitor med tilhørende indikatorer, der nødvendige publiserings-, forvaltnings- og driftsprosesser er på plass.
Generelle prosjekter (Rune Pedersen)	2017-5a (43 473)	Formidling av e-helseforskning i Norge (Inger Marie Holm)	Strategisk prosjekt NSE	Prosjektet skal bidra til kunnskapsbasert politikk og praksis i det nasjonale e-helsefeltet gjennom analyse av forskningsstatus i det nasjonale-helsefeltet.
	2017-5c (43 473)	Fremtidens helse (Inger Marie Holm)	Strategisk prosjekt NSE	Prosjektet skal levere faktaark til Direktoratet for e-helse om resultater og funn fra nyere forskning publisert ved Nasjonalt senter for e-helseforskning.
	2017-5b (43492)	EHIN 2017 (Eli Kristiansen)	Direktoratet for e-helse / EHIN	Ny innretning for prosjektet «formidling av e-helseforskning i Norge»
	2017-5d (43 486)	Nasjonale e-hesløsninger og styringsstrukturer (Line Linstad)	Internt prosjekt NSE	Formålet er å forankre og utvikle en protokoll for et forskningsprosjekt med fokus på det nasjonale e-helse styringssystemet. Empiri fra Helseplattformen.
	2017-5e (43 674)	Følgeforskning HTA på e-helsefeltet (Anne G. Ekeland)	Folkehelseinstituttet	Det er avtalt møte med Folkehelseinstituttet i mai. NSE har ett pågående eksternt finansiert prosjekt.

# Oversikt pågående nasjonale prosjekter 2017 – side 3

Portefølje (porteføljestyrer)	Nr. (prosjektnr)	Prosjekt (prosjektleder)	Samarbeids-partner	Kort beskrivelse av prosjektet
Lederteamet NSE	2017-6a	Kunnskapsbanken (Randi Laukli)	Internt prosjekt NSE	Strategisk posisjonering av NSE internasjonalt.
	2017-6b (43 475)	USAM (Eli Kristiansen)	Strategisk prosjekt NSE	Kompetansehevende tiltak internt på NSE, finansiert av USAM midlene
	2017-6c	WHO (Tove Sørensen)	Internt prosjekt NSE	Hele NSE er et samarbeidssenter for Verdens Helseorganisasjon. Avtalen fornyes hvert 4. år.
	2017-6d	Internasjonal rolle (Line Linstad)	Internt prosjekt NSE	Strategisk posisjonering av NSE internasjonalt.
	2017-6e	Ad-hoc (Tom Atle Bakke)	Internt prosjekt NSE	Senteret har holdt av ressurser for å kunne ta imot ad-hoc oppgaver fra våre oppdragsgivere innen våre strategiske satsingsområder.

# Innhold og ledelsessammendrag – side 1

	Prosjekt/ program	Side	Avgrensning og innhold	Økonomi	Ressurser	Fremdrift	Eksterne avhengigheter
En journal (Rune Pedersen)	Følgforskning for utprøving EIEJ ved Helseplattformen (Rune Pedersen)	16-19	●	●	●	●	●
	Planlegge og gjennomføre nullpunktsanalyser EIEJ (Gunn Hilde Rotvoll)	20– 23	●	●	●	●	●
	Ontologibaserte terminologier (Kristian Nicolaisen)	24 – 27	●	●	●	●	●
	Utredning av arkitekturmessig praksis og mulighetsrom for klinisk beslutningsstøtte Kristian Nicolaisen)	28 – 31	●	●	●	●	●
Nasjonale ehelseløsninger (Monika Johansen)	Kjernejournal (3B) (Kari Dyb)	32 – 35	●	●	●	●	●
	Kjernejournal 2 - kritisk informasjon (Nils Kolstrup/Monika Johansen)	36 – 39	●	●	●	●	●
	Multidose 2 (Trine Bergmo)	40 – 43	●	●	●	●	●
	Samhandlingsarena 2 (Gunn Hilde Rotvoll)	44 – 47	●	●	●	●	●
	m&eHealth (Gunn Hilde Rotvoll)	48 – 51	●	●	●	●	●
	Nasjonale e-helseløsninger (Line L. Warth)	52 – 55	●	●	●	●	●
	Realisere og maksimere nytteeffektene av digitale helsetjenester (Paolo Zanaboni)	56 – 59	●	●	●	●	●

# Innhold og ledelsessammendrag – side 2

	Prosjekt/ program	Side	Avgrensning og innhold	Økonomi	Ressurser	Fremdrift	Eksterne avhengigheter
Velferdsteknologi, m-helse og egenmestring (Siri Bjørvig)	Kunnskapsoppsummering velferdsteknologi (4A) (Undine Knarvik)	60 - 63					
	Barn og unge (4B) (Marianne Trondsen)	64 - 67					
	Sosial kontakt (4C) (Elin Johnsen)	68 - 71					
	Datautveksling - fra pasient til helsetjeneste (Eirik Årsand)	72 - 75					
	Pasientfortellinger som kunnskapsformidler til pasienter, pårørende og helsepers (Marianne Trondsen)	76 -79					
	Barn og unge 2 (Marianne Trondsen)	80 -83					
	Sosial kontakt 2 (Siri Bjørvig)	<i>Ikke levert rapport</i>					
Helse-dataanalyse (Anne Torill Nordsletta)	My data 2016 (2E) (Line Linstad)	84 - 87					
	Helsedata (Per Atle Bakkevoll)	88 - 91					
	E-helse monitor 2017 (Gunn Hilde Rotvoll)	92 - 95					
Generelle prosjekter (Rune Pedersen)	Formidling av e-helseforskning i Norge (Inger Marie Holm)	96 - 99					
	Fremtidens helse (Inger Marie Holm)	100-103					
	EHIN 2017 (Eli Kristiansen)	104-107					
	Nasjonale e-helseløsninger og styringsstrukturer (Line Linstad)	108 - 111					
	Følgeforskning HTA på e-helsefeltet (forankring mot FHI) (Anne G. Ekeland)	<i>Ikke levert rapport</i>					

# Innhold og ledelsessammendrag – side 2

	Prosjekt/ program	Side	Avgrensning og innhold	Økonomi	Ressurser	Fremdrift	Eksterne avhengigheter
Lederteamet NSE	Kunnskapsbanken (Randi Laukli)	<i>Ikke levert rapport</i>	○	○	○	○	○
	USAM (Eli Kristiansen)	<i>112 -115</i>	●	●	●	●	●
	WHO (Tove Sørensen)	<i>116 -119</i>	●	●	●	●	●
	Internasjonal rolle (Line Linstad)	<i>120 – 123</i>	●	●	●	●	●
	Ad-hoc (Tom Atle Bakke)	<i>124 -127</i>	●	●	●	●	●



# Omfang, strategiske satsingsområder og faser – side 1

Portefølje (porteføljestyrer)	Prosjekt (prosjektleder)	Prosjektnr.	Satsingsområde NSE	Prosjektfase	Totalbudsjett
En journal (Rune Pedersen)	Følgforskning for utprøving EIEJ ved Helseplattformen (Rune Pedersen)	43 482	Helhetlige helsetjenester	Gjennomføre	885 520 kr
	Planlegge og gjennomføre nullpunktsanalyser EIEJ (Gunn Hilde Rotvoll)	43 480	Fremtidens journal	Gjennomføre	1 042 000 kr
	Ontologibaserte terminologier (Kristian Nicolaisen)	43 478	Helhetlige helsetjenester	Gjennomføre	907 520 kr
	Utredning av arkitekturmessig praksis og mulighetsrom for klinisk beslutningsstøtte (Kristian Nicolaisen)	43 479	Helhetlige helsetjenester	Gjennomføre	797 000 kr
Nasjonale e-helseløsninger (Monika Johansen)	Kjernejournal (3B) (Kari Dyb)	43 449	Fremtidens journal	Gjennomføre	2 750 000 kr
	Kjernejournal 2 - kritisk informasjon (Nils Kolstrup/Monika Johansen)	43 461	Fremtidens journal	Planlegge / gjennomføre	497 877 kr
	Multidose 2 (Trine Bergmo)	43 462	Fremtidens journal	Planlegge	1 865 198 kr
	Samhandlingsarena 2 (Gunn Hilde Rotvoll)	43 463	Helhetlige helsetjenester	Planlegge	921 244 kr
	m&eHealth (Gunn Hilde Rotvoll)	43 283	Helhetlige helsetjenester	Konsept	700 000 kr
	Nasjonale e-helseløsninger (Line L. Warth)	43 464	Fremtidens journal	Planlegge	150 000 kr
	Nytteeffektene av digitale helsetjenester (Paolo Zanaboni)	43 465	Fremtidens journal	Idèfase	1 700 000 kr


# Omfang, strategiske satsingsområder og faser – side 2

Portefølje (porteføljestyrer)	Prosjekt (prosjektleder)	Prosjektnr.	Satsingsområde NSE	Prosjektfase	Totalbudsjett
Velferdsteknologi, m-helse og egenmestring (Siri Bjørvig)	Kunnskapsoppsummering velferdsteknologi (4A) (Undine Knarvik)	43 451	Personlige systemer og velferdsteknologi	Gjennomføre	1 813 022 kr
	Barn og unge (4B) (Marianne Trondsen)	43 452	Personlige systemer og velferdsteknologi	Datainnsamling (gjennomføre)	982 550 kr
	Sosial kontakt (4C) (Elin Johnsen)	43 453	Personlige systemer og velferdsteknologi	Avslutte	875 200 kr
	Datautveksling - fra pasient til helsetjeneste (Eirik Årsand)	43 466	Personlige systemer og velferdsteknologi	Planlegge	1 015 500 kr
	Pasientfortellinger som kunnskapsformidler til pasienter, pårørende og helsepers (Marianne Trondsen)	43 467	Personlige systemer og velferdsteknologi	Planlegge	300 000 kr
	Barn og unge 2 (Marianne Trondsen) *Budsjettet gjelder kun for 2017 (senere år ikke avklart)	43 483	Personlige systemer og velferdsteknologi	Forfase / Planlegge	485 075 kr*
	Sosial kontakt 2 (Elin Johnsen/Siri Bjørvig)	43 484	Personlige systemer og velferdsteknologi	Planlegge	850 000 kr
Helse-dataanalyse (Anne Torill Nordsletta)	My data 2016 (2E) (Line Linstad)	43 460	Tilgjengeliggjøring og analyse av data	Avslutte	310 650 kr
	Helsedata (Per Atle Bakkevoll)	43 470	Tilgjengeliggjøring og analyse av data	Planlegge / gjennomføre	1 200 000 kr
	E-helse monitor 2017 (Gunn Hilde Rotvoll)	43 472	Tilgjengeliggjøring og analyse av data	Planlegge / gjennomføre	852 110 kr
Generelle prosjekter (Rune Pedersen)	Formidling av e-helseforskning i Norge (Inger Marie Holm)	43 473	Generelt prosjekt	Planlegge / gjennomføre	644 000 kr
	Fremtidens helse (Inger Marie Holm)	43 474	Generelt prosjekt	Planlegge / gjennomføre	677 766 kr
	EHIN 2017 (Eli Kristiansen)	43 492	Generelt prosjekt	Forfase / Planlegge	450 000 kr
	Nasjonale e-helseløsninger og styringsstrukturer (Line Linstad)	43 486	Generelt prosjekt	Konsept	300 000 kr
	Følgforskning HTA på e-helsefeltet (forankring mot FHI) (Anne G. Ekeland)	43 674	Generelt prosjekt	Gjennomføre	5 069 988 kr


# Omfang, strategiske satsingsområder og faser – side 2

Portefølje (porteføljestyrer)	Prosjekt (prosjektleder)	Prosjektnr.	Satsingsområde NSE	Prosjektfase	Totalbudsjett
Lederteamet NSE	Kunnskapsbanken (Randi Laukli)				
	USAM (Eli Kristiansen)	43475	Generelt prosjekt	Gjennomføre	3 000 000
	WHO (Tove Sørensen)	43 400	Generelt prosjekt	Gjennomføre	370 000
	Internasjonal rolle (Line Linstad)	43 477	Generelt prosjekt	Planlegge/gjennomføre	756 262
	Ad-hoc (Tom Atle Bakke)	43 457	Generelt prosjekt	Gjennomføre	1 000 000

# Pågående nasjonale prosjekter - omfang, strategiske satsingsområder og faser

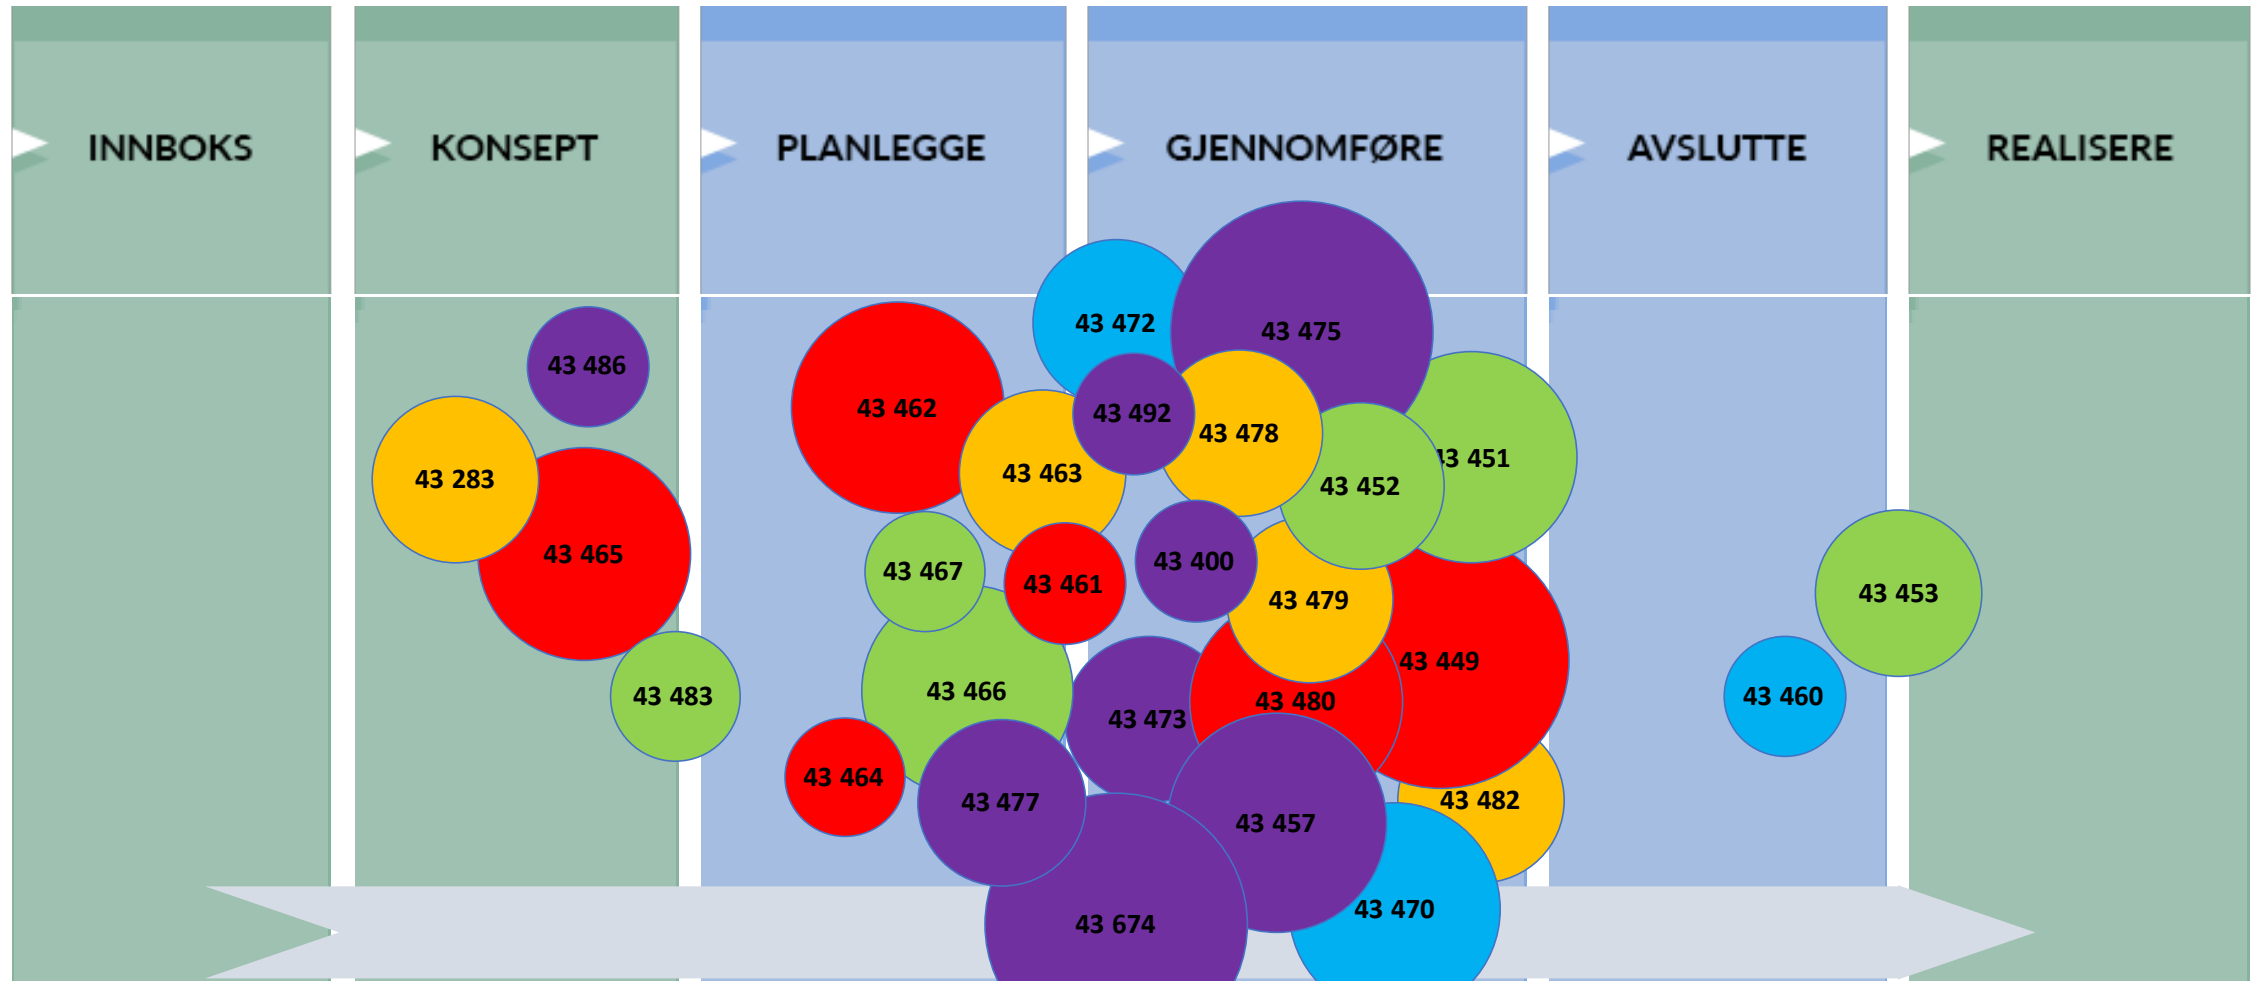

- Fremtidens journal
- Helhetlige helsetjenester
- Personlige systemer og velferdsteknologi
- Tilgjengeliggjøring og analyse av data
- Generelt prosjekt



*Sirklenes størrelse (økonomisk omfang) gjenspeiler totalbudsjett per d.d. Prosjekter i ide- og konseptfase har normalt ikke vedtatt endelige rammer.*

# Status for økonomi og leveranser – side 1

Portefølje (porteføljestyrer)	Prosjekt (prosjektleder)	Budsjett hele prosjekt-perioden	Regnskap hele prosjekt-perioden	% Gjenstår budsjett	Start (dato)	Planlagt slutt (dato)	Evt. ny slutt (dato)	% Gjenstår sluttleveranse	Neste leveranse
En journal (Rune Pedersen)	Følgforskning for utprøving EIEJ ved Helseplattformen (Rune Pedersen)	885 520	311 282	65 %	01.01.2017	15.09.2017		75 %	21.6.2017
	Planlegge og gjennomføre nullpunktsanalyser EIEJ (Gunn Hilde Rotvoll)	1 042 000	489 785	53 %	01.01.2017	15.11.2017		70 %	30.5.2017
	Ontologibaserte terminologier (Kristian Nicolaisen)	907 520	294 761	67 %	01.01.2017	15.09.2017		50 %	31.6.2017
	Utredning av arkitekturmessig praksis og mulighetsrom for klinisk beslutningsstøtte (Kristian Nicolaisen)	797 000	312 524	60 %	01.01.2017	15.09.2017		55 %	31.5.2017
Nasjonale ehelseløsninger (Monika Johansen)	Kjernejournal (3B) (Kari Dyb)	2 750 000	1 666 890	39 %	01.06.2016	31.12.2017		30 %	15.12.2017
	Kjernejournal 2 - kritisk informasjon (Nils Kolstrup/Monika Johansen)	497 877	77 383	85 %	01.01.2017	31.12.2017		75 %	?
	Multidose 2 (Trine Bergmo)	1 865 198	110 284	94 %	01.01.2017	xx.xx.2018		95 %	1.7.2017
	Samhandlingsarena 2 (Gunn Hilde Rotvoll)	921 244	259 971	72 %	01.01.2017	15.10.2017		45 %	Nov 2017
	M&eHealth (Gunn Hilde Rotvoll)	700 000	59 091	84 %	01.03.2017	01.03.2019		100 %	?
	Nasjonale e-helseløsninger (Line L. Warth)	150 000	152 338	-2 %	01.01.2017	31.01.2019		100 %	2018
	Nytteeffektene av digitale helsetjenester (Paolo Zanaboni)	1 700 000	149 676	91 %	25.03.2017	31.12.2017		100 %	31.7.2017

# Status for økonomi og leveranser – side 2

Portefølje (porteføljestyrrer)	Prosjekt (prosjektleder)	Budsjett hele prosjekt-perioden	Regnskap hele prosjekt-perioden	% Gjenstår budsjett	Start (dato)	Planlagt slutt (dato)	Evt. ny slutt (dato)	% Gjenstår sluttleveranse	Neste leveranse
Velferdsteknologi, m-helse og egenmestring (Siri Bjørvig)	Kunnskapsoppsummering velferdsteknologi (4A) (Undine Knarvik)	1 813 022	1 484 728	18 %	01.08.2016	30.09.2017		43 %	31.5.2017
	Barn og unge (4B) (Marianne Trondsen)	982 550	596 105	39 %	01.06.2016	15.05.2017	15.06.2017	30 %	15.6.2017
	Sosial kontakt (4C) (Elin Johnsen)	875 200	871 158	0 %	20.05.2016	31.03.2017	30.04.2017	0 %	Levert
	Datautveksling - fra pasient til helsetjeneste (Eirik Årsand)	1 015 500	428 810	58 %	01.02.2017	01.01.2018		80 %	?
	Pasientfortellinger som kunnskapsformidler til pasienter, pårørende og helsepers (Marianne Trondsen)	300 000	126 370	58 %	01.01.2017	31.12.2017		100 %	20.6.2017
	Barn og unge 2 (Marianne Trondsen) *Budsjett 2017 (senere år ikke avklart)	485 075	29 433	94 %	Vår 2017	Vår 2018		100 %	?
	Sosial kontakt 2 (Elin Johnsen/Siri Bjørvig)	850 000	1 750	100 %	01.01.2017	31.12.2017		100 %	?
Helse-dataanalyse (Anne Torill Nordsletta)	My data 2016 (2E) (Line Linstad)	310 650	310 257	0 %	01.10.2016	31.03.2017			?
	Helsedata (Per Atle Bakkevoll)	1 200 000	506 008	58 %	01.01.2017	15.09.2017		80 %	15.9.2017
	E-helse monitor 2017 (Gunn Hilde Rotvoll)	852 110	231 783	73 %	01.01.2017	31.12.2017		80 %	?
Generelle prosjekter (Rune Pedersen)	Formidling av e-helseforskning i Norge (Inger Marie Holm)	644 000	282 693	56 %	01.01.2017	30.11.2017		70 %	?
	Fremtidens helse (Inger Marie Holm)	677 000	455 093	33 %	01.01.2017	31.12.2017		90 %	?
	EHIN 2017 (Eli Kristiansen)	450 000	21 406	95 %	01.01.2017	31.12.2017		95 %	1.10.2017
	Nasjonale e-helseløsninger og styringsstrukturer (Line Linstad)	300 000	62 414	79 %	01.01.2017	01.09.2017		90 %	1.9.2017
	Følgforskning HTA på e-helsefeltet (forankring mot FHI)	5 069 988	2 027 101	60 %	01.01.2016	31.12.2018		66 %	?

# Status for økonomi og leveranser – side 2

Portefølje (porteføljestyrer)	Prosjekt (prosjektleder)	Budsjett hele prosjekt-perioden	Regnskap hele prosjekt-perioden	% Gjenstår budsjett	Start (dato)	Planlagt slutt (dato)	Evt. ny slutt (dato)	% Gjenstår sluttleveranse	Neste leveranse
Lederteam NSE	Kunnskapsbanken (Randi Laukli)	1 000 000	14 438	99 %	01.01.2017	31.12.2017			
	USAM (Eli Kristiansen)	3 000 000	201 154	93 %	01.01.2017	31.12.2017		65%	?
	WHO (Tove Sørensen)	370 000	153 764	58 %	01.01.2017	31.12.2017		?	?
	Internasjonal rolle (Line Linstad)	756 262	467 822	38 %	01.01.2017	31.12.2017		?	?
	Ad-hoc (Tom Atle Bakke)	1 000 000	29 102	97 %	01.01.2017	31.12.2017		90 %	1.6.2017

